


O CLIENTE IMPÔS UM TETO. A RESPOSTA FOI OUTRA CASA.

A casa chegou como croqui à mão, fotografado pelo WhatsApp. Orçada, fechou em R\$ 1,18 milhão. O cliente tinha R\$ 500 mil.

| R\$ 1,18 MI ————— MESMAS REGRAS DE CÁLCULO ————— R\$ 452.865 |

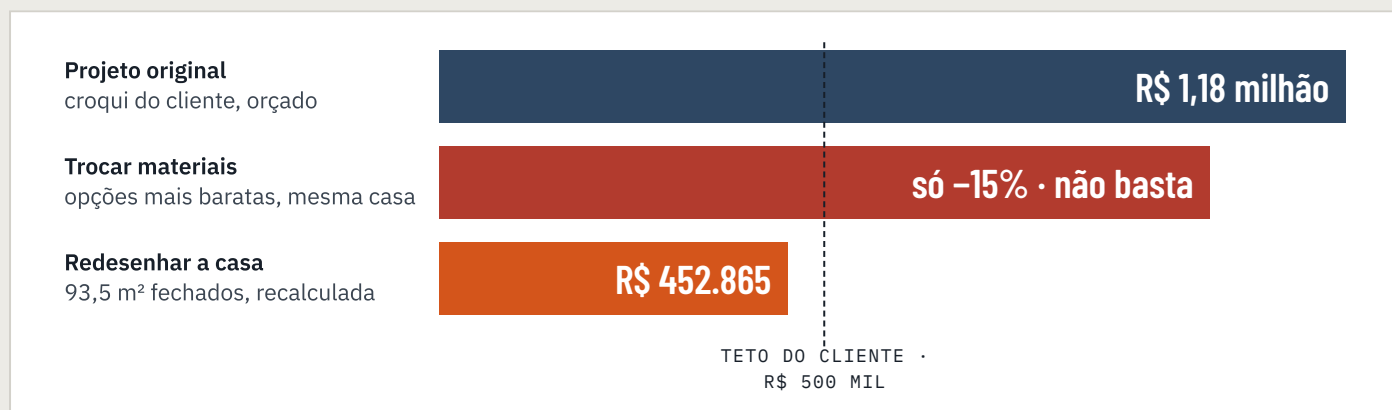

Barra em escala. Valores de proposta, não de contrato assinado.

O PROBLEMA

Entre o desejo do cliente e o dinheiro dele havia **R\$ 680 mil**. O caminho comum — "vamos ver onde dá para economizar" — costuma virar idas e vindas sem número na mesa.

O QUE FIZ

Mostrei com números que trocar materiais tirava **só 15%**. Então redesenhei a casa que cabia no teto e recalculei tudo pelas mesmas regras: quantidades medidas na planta, custo por serviço, prazo pela equipe real.

RESULTADO

R\$ 452.865 e 54 dias de obra, com folga de R\$ 47 mil abaixo do teto. O cliente saiu com uma casa que pode pagar e a lista do que pode acrescentar depois.

CADA ACRÉSCIMO COM O PREÇO À VISTA — O CLIENTE ESCOLHE, NÃO ADIVINHA

OPCIONAL

Varanda

Medida e precificada à parte, pelo mesmo método.

OPCIONAL

Garagem

Entra ou sai sem refazer o orçamento inteiro.

OPCIONAL

Pé-direito maior

Quanto custa cada centímetro a mais de parede.

-62%

do orçamento original ao que coube no teto

54 dias

de obra, calculados pela sequência de serviços e pela equipe

R\$ 47 mil

de folga abaixo do teto de R\$ 500 mil

93,5 m²

fechados na casa redesenhada

TEM UM CLIENTE COM TETO DE ORÇAMENTO?

Entre em contato.

Procuo uma vaga em orçamento, planejamento e custos de obra, CLT ou PJ, ou um serviço pontual nessas áreas.

CÁSSIO VILLER

Engenharia Civil · 7º semestre

(12) 98207-1116 · WhatsApp

cassiovillers@gmail.com

São José dos Campos/SP
