

23 DIÁRIOS DE OBRA ESTAVAM SÓ NO WHATSAPP

No sistema, 28 atividades já concluídas apareciam como atrasadas. Pela tela a obra parecia parada, enquanto no canteiro o serviço avançava.

| 42 DIÁRIOS ATÉ 11/08 ————— DEPOIS, NADA NO SISTEMA ————— 23 DIAS RECUPERADOS |

ANTES · O QUE O CRONOGRAMA MOSTRAVA




28 atividades prontas no canteiro, marcadas como atrasadas.



DEPOIS · COM A CARGA (CÓPIA DO SISTEMA)



27,6% → 44,7% concluído, contra 60,8% planejado.

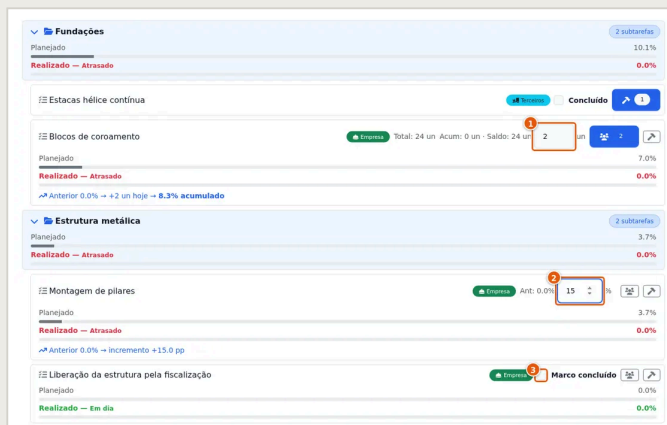

Tela real do diário de obra: o avanço é informado por quantidade, percentual ou marco concluído, e o cronograma é atualizado.

O PROBLEMA

Numa obra de galpões, o encarregado dizia que os diários estavam "devidamente atualizados", e estavam mesmo, só que **no grupo de WhatsApp**. Sem diário no sistema, o cronograma não anda e a medição não fecha.

O QUE FIZ

Li as mensagens e fotos do grupo, dia a dia, e montei uma carga de dados para recuperar o período. **Cada percentual tem uma justificativa escrita**, baseada na mensagem do dia, num relatório que o gestor pode conferir.

RESULTADO

Recuperei **23 diários, 185 fotos e 72 registros de avanço** em 23 atividades. Numa cópia do sistema com os dados reais, a obra passa de **27,6% para 44,7%** (60,8% planejado). No sistema em uso, a carga ainda estava pendente.

COMO A RECUPERAÇÃO FOI FEITA SEM CRIAR OUTRO PROBLEMA

- 01 Simulação antes de gravar.** A carga mostra tudo o que seria criado, sem gravar nada, para o gestor aprovar.
- 03 Ficou como ferramenta do sistema.** Importa de uma vez diários e fotos que ficaram de fora, sempre com simulação.

- 02 Não desfaz avanço já lançado.** Se o sistema já tem um número maior, a carga mantém esse número.
- 04 Também gerou a norma escrita do diário.** A carga corrige os números que já passaram, e o acordo com quem preenche evita que o problema se repita.

23

diários de obra recuperados

185

fotos ligadas ao dia e à atividade

72

registros de avanço, cada um com justificativa

28

atividades prontas que o sistema mostrava como atrasadas

CONTATO

Entre em contato.

Trabalhei com diário, cronograma, medição, compras e caixa, e criei o sistema que liga todos. Procuro uma vaga nessas áreas, CLT ou PJ, ou um serviço pontual.

CÁSSIO VILLER

Engenharia Civil · 7º semestre
(12) 98207-1116 · WhatsApp
cassiovillers@gmail.com
São José dos Campos/SP
