

23 DIÁRIOS DE OBRA ESTAVAM SÓ NO WHATSAPP

No sistema, 28 atividades já concluídas apareciam como atrasadas. Quem olhava a tela via uma obra parada; quem estava no canteiro via o serviço andando.

| 42 DIÁRIOS ATÉ 11/08 ————— DEPOIS, NADA NO SISTEMA ————— 23 DIAS RECUPERADOS |

ANTES · O QUE O CRONOGRAMA MOSTRAVA




28 atividades prontas no canteiro, marcadas como atrasadas.



DEPOIS · COM A CARGA (CÓPIA DO SISTEMA)



27,6% → 44,7% concluído, contra 60,8% planejado.

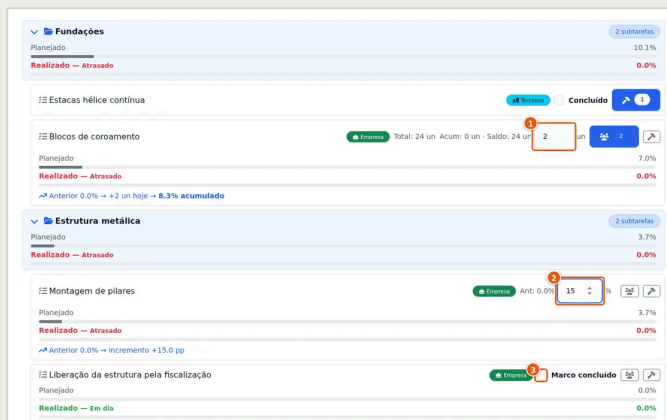

Tela real do diário de obra: o avanço é informado por quantidade, percentual ou marco concluído — e o cronograma se move.

O PROBLEMA

Numa obra de galpões, o encarregado garantia que os diários estavam "devidamente atualizados" — e estavam, mas **no grupo de WhatsApp**. Sem diário no sistema, o cronograma não anda e a medição não fecha.

O QUE FIZ

Li as mensagens e fotos do grupo, dia a dia, e montei uma carga de recuperação. **Cada percentual ganhou uma justificativa escrita**, apoiada no que a mensagem do dia dizia, num relatório que o gestor pode conferir.

RESULTADO

23 diários, 185 fotos e 72 registros de avanço em 23 atividades. Lida numa cópia com os dados reais, a obra vai de **27,6% a 44,7%** (60,8% planejado). No sistema em uso, a carga ainda estava pendente.

COMO A RECUPERAÇÃO FOI FEITA SEM CRIAR OUTRO PROBLEMA

- 01 Ensaio antes de gravar.** A carga mostra tudo o que seria criado, sem gravar nada, para o gestor aprovar.
- 03 Virou ferramenta permanente.** Importar de uma vez diários e fotos que ficaram de fora, sempre com ensaio.

- 02 Nunca desfaz avanço já lançado.** Se o sistema já tem um número maior, a carga se recusa a voltar atrás.
- 04 E virou norma escrita do diário.** Recuperar o passado corrige o número de hoje; só o acordo com quem preenche evita o próximo buraco.

23

diários de obra recuperados

185

fotos ligadas ao dia e à atividade

72

registros de avanço, cada um com justificativa

28

atividades prontas que o sistema mostrava como atrasadas

SUA OBRA ANDA NO CANTEIRO E NÃO NO RELATÓRIO?

Eu sei onde a informação se perde.

Diário, cronograma, medição, compras e caixa — trabalhei em cada um e criei o sistema que liga todos. Entre em contato.

CÁSSIO VILLER

Engenharia Civil · 7º semestre
(12) 98207-1116 · WhatsApp
cassiovillers@gmail.com
São José dos Campos/SP
